

松阪市 土日完全週休2日制工事（発注者指定型／経費補正なし）特記仕様書

- 1 土日完全週休2日制工事（以下、「週休2日」という。）とは、工事開始日から工事完成届の提出日までを対象期間^{※1}として、現場閉所^{※2}を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。
- 2 通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5％）以上であることをいう。（別紙参照）

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く。

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）
- ・年末年始休暇（6日間）
- ・工場制作のみの期間
- ・工事故等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

- 3 受注者は、対象期間中の月毎に現場閉所の状況を監督員に報告すること。
また、対象期間終了後には、通期の週休2日の達成状況を報告すること。

- 4 週休2日に関する経費の補正はしないものとする。


- 5 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

なお、発注者の指示による土日作業（同一週内での指示によるものを除く。）のため現場閉所日を平日に振り替える場合は、原則、前後2週間以内の平日へ振り替えるものとする。

- 6 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※3が配布する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)

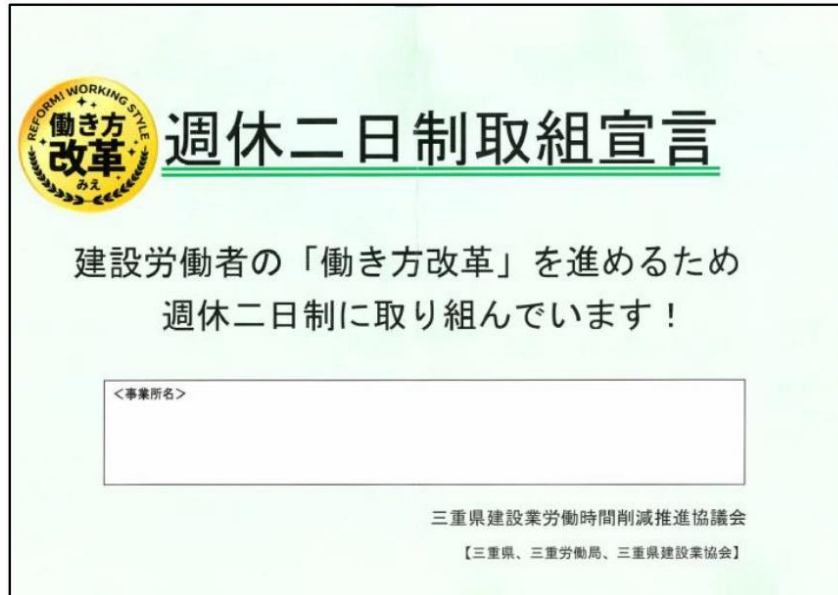

【入手方法】

- ・HPからダウンロードする場合

【三重労働局ダウンロードページ】

http://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html

- ※3 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

【別紙 通期の週休2日の考え方】

通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休2日は、以下のとおり、月1回の現場閉所状況を確認し、対象期間終了後に週休2日の達成状況を確認する。

A月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契約日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A 月

- ・対象期間 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数/対象期間日数 対象外
- ・土日現場閉所 対象外

B月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B 月

- ・対象期間 29 日
- ・現場閉所日数 8 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
8 日/29 日＝27.6…NG 工期全体で評価
- ・土日現場閉所 OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C 月

- ・対象期間 6 日
- ・現場閉所日数 2 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
2 日/6 日＝33.3… OK
- ・土日現場閉所 OK

準備・後片付け期間

対象期間

通期（工期全体）

- ・対象期間 35 日
- ・閉所日数 10 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
10 日/35 日＝28.6…
- ・土日現場閉所 全て OK

【農業農村整備工事編】

【参考】現場閉所状況の報告書の例（松阪市 HP からダウンロードできます）

土日完全週休2日制工事 月単位・通期 確認表

工事名	〇〇工事
工 期	～
工事開始日	完成報告提出日

請負業者名	〇〇株式会社
現場代理人	〇〇 〇〇

※工事開始日と完成報告書提出日は最後の報告時に入力してください

まず、工事名・工期等を入力してください
工期を入力すると自動で年月日や曜日が反映されます

※週別シートにも反映されます

判定

週休2日

- ・月単位の週休2日
- ・通期（対象期間全体）の週休2日
- ・すべての土日（祝日も含む）

X

X

X

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

※成績評定の加点は対象期間が28日以上の場合に対象となります。

計画	対象日	曜日	日数	所要率	4週間平均	指定土日	成績	加減	▼凡例に従って左の計画・実施表に入力してください
計画	対象日	曜日	0	0.0%	対象外	/	/	-	上段：通常作業期間、片側片付期間、夜間作業期間、冬季休業前準備期間、 仮設工事関係期間、○+対象期間、下段：●+開所予定日
実績	対象日	曜日	0	0.0%	対象外	対象外	-	-	上段：上段：専ら工事事故等による不稼働期間、仮設工事に対する突発的な対応期間、 他々その他、同一箇所に発生する土日は作業等、下段：●+開所日
備考									▲実施入力時に右の凡例に従って入力してください

計画	対象日	曜日	日数	所要率	4週間平均	指定土日	成績	加減	▼凡例に従って左の計画・実施表に入力してください
計画	対象日	曜日	0	0.0%	対象外	/	/	-	上段：通常作業期間、片側片付期間、夜間作業期間、冬季休業前準備期間、 仮設工事関係期間、○+対象期間、下段：●+開所予定日
実績	対象日	曜日	0	0.0%	対象外	対象外	-	-	上段：上段：専ら工事事故等による不稼働期間、仮設工事に対する突発的な対応期間、 他々その他、同一箇所に発生する土日は作業等、下段：●+開所日
備考									▲実施入力時に右の凡例に従って入力してください

計画	対象日	曜日	日数	所要率	4週間平均	指定土日	成績	加減	▼凡例に従って左の計画・実施表に入力してください
計画	対象日	曜日	0	0.0%	対象外	/	/	-	上段：通常作業期間、片側片付期間、夜間作業期間、冬季休業前準備期間、 仮設工事関係期間、○+対象期間、下段：●+開所予定日
実績	対象日	曜日	0	0.0%	対象外	対象外	-	-	上段：上段：専ら工事事故等による不稼働期間、仮設工事に対する突発的な対応期間、 他々その他、同一箇所に発生する土日は作業等、下段：●+開所日
備考									▲実施入力時に右の凡例に従って入力してください

計画時の確認

対象予定日数	0
箇所予定日数	0
達成予定率	

実績の確認

対象日数	0
箇所日数	0
達成率	

通期（対象期間全体）の週休2日の状況
